

Honlapra, 75%-os készültség


A kerékpárút első két ütemének kivitelezése az alábbiak szerint zajlik.

75%-os teljesítés, Soproni utcai szakasz:

A mérnöki jelentés alapján 2018. október 08-án érte el a kivitelezés a 75%-os teljesítést. A megkezdett munka folytatásaként az alábbi tevékenységek zajlottak a szakaszon:

A releváns időszakban folytatódott a szikkasztó árkok építése és a szegélyek bontása, humuszosítás. A terelősziget helyén bontási munkálatok, illetőleg fagyvédő réteg készítése történt, majd szegély építés, mechanikai stabilizáció készítése és térkő burkolat készítése.



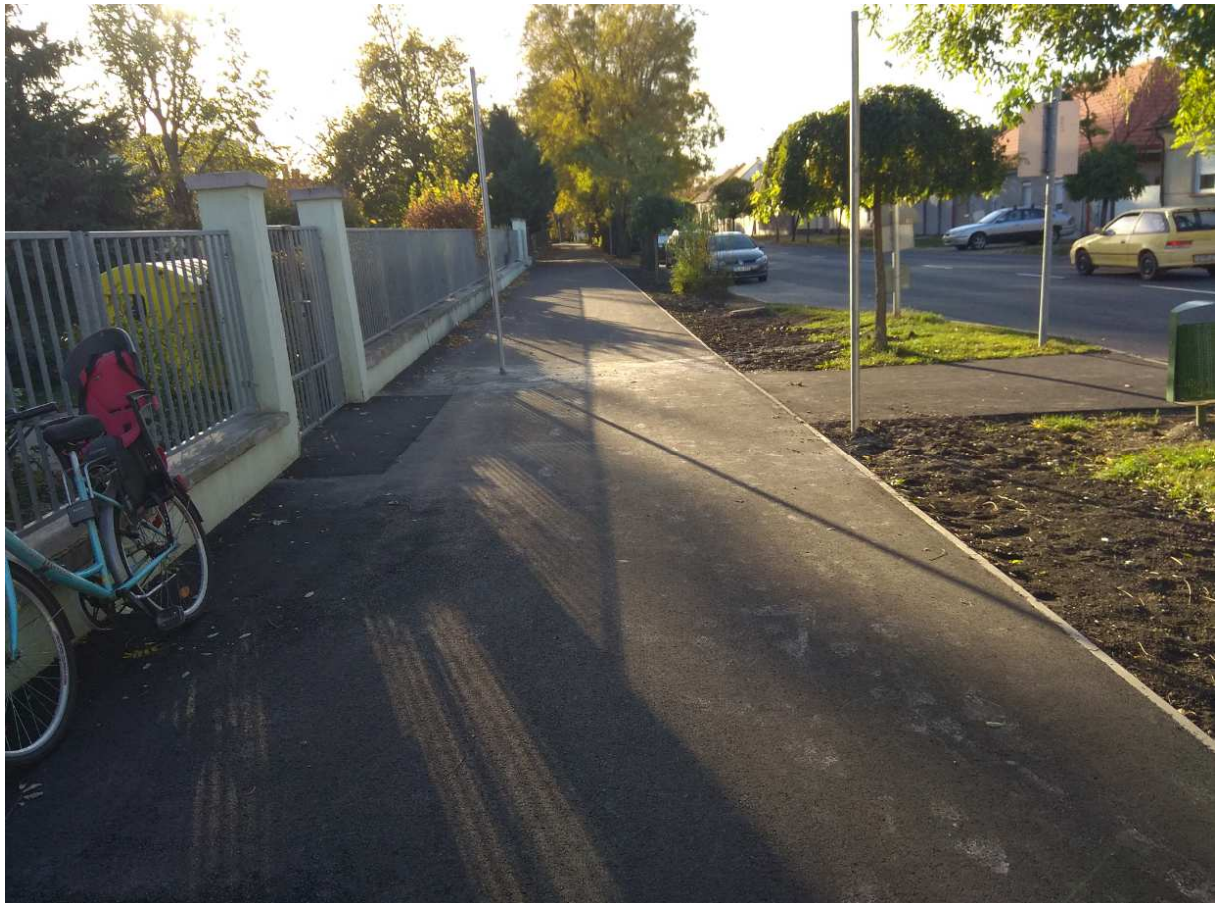

75%-os teljesítés, Szent István király utcai szakasz:

A mérnöki jelentés alapján 2018. október 27-én érte el a kivitelezés a 75%-os teljesítést. A megkezdett munka folytatásaként az alábbi tevékenységek zajlottak a szakaszon:

bontási munkák, fagyvédő réteg készítése, szegélyek építése folytatódott. A soron következő kilométer szelvényeknél CKT burkolatalap készült. Víznyelők átépítése, közműszerelvények szintre állítása történt.







